

«СОГЛАСОВАНО»
И.О. Главы города Березники

[Signature]
В.П. Шанина
«23.09» 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Пермского филиала ПАО «Т Плюс»


Ю.Н. Багаев

«23.09» 2020 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ВК "Усолье" на отопительный сезон 2020 - 2021 г.г.

Температура наружного воздуха	Температура теплоносителя в подающем т/проводе	Температура теплоносителя в обратном т/проводе
оС	оС	оС
летний	70	56
10	70	56
9	70	56
8	70	55
7	70	55
6	70	55
5	70	54
4	70	54
3	70	54
2	70	53
1	70	53
0	70	53
-1	70	52
-2	70	52
-3	70	52
-4	70	51
-5	70	51
-6	70	51
-7	70	50
-8	70	50
-9	70	50
-10	72	51
-11	73	52
-12	75	52
-13	76	53
-14	78	54
-15	79	55
-16	81	55
-17	82	56
-18	84	57
-19	85	58
-20	86	58
-21	88	59
-22	89	60
-23	91	60
-24	92	61
-25	93	62
-26	95	63
-27	96	63
-28	98	64
-29	99	65
-30	100	65
-31	102	66
-32	103	67
-33	105	67
-34	106	68
-35	107	69
-36	109	69
-37	110	70

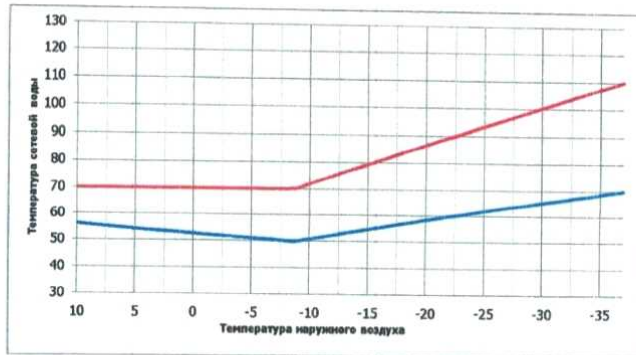

Источник	Расход (т/час)	Давление на отметке "0" (н. вод. ст.)		Производительность подпиточного устройства (т/час)	
		подающий т/провод	обратный т/провод	нормальная	аварийная
ВК Усолье	788	61	10	10	30

Технический директор - главный инженер ООО "ПСК"

Зам. главного инженера по эксплуатации ООО "ПСК"

Нач. отдела режимов и наладки ООО "ПСК"

Нач. производственно-технического отдела ООО "ПСК"

Представитель по доверенности АО "Березниковская сетевая компания"

[Signature]
С.В. Гужев

[Signature]
Ю.Г. Суслов

[Signature]
А.А. Куприков

[Signature]
Н.П. Ощепков

[Signature]
Д.Ю. Ярицкий

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Кондулиц

[Signature]

«СОГЛАСОВАНО»

М.п. Главного города Березники

В.П. Манин

В.П. Манин

2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
Пермского филиала ПАО "Т Плюс"


Ю.Н. Багаев

2020 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

модульной газовой котельной ВК Гор.больница на отопительный сезон 2020 - 2021 г.г.

Температура наружного воздуха	Температура теплоносителя в подводящем трубопроводе	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
°С	°С	°С
летний	0	0
10	70	51
9	70	51
8	70	50
7	70	50
6	70	49
5	70	49
4	70	49
3	70	48
2	70	48
1	70	47
0	70	47
-1	70	46
-2	70	46
-3	70	46
-4	71	46
-5	73	47
-6	75	48
-7	77	48
-8	79	49
-9	81	50
-10	82	51
-11	84	52
-12	86	52
-13	88	53
-14	90	54
-15	91	55
-16	93	55
-17	95	56
-18	97	57
-19	99	58
-20	100	58
-21	102	59
-22	104	60
-23	106	60
-24	107	61
-25	109	62
-26	111	63
-27	113	63
-28	114	64
-29	115	64
-30	115	63
-31	115	63
-32	115	63
-33	115	62
-34	115	62
-35	115	61
-36	115	61
-37	115	60

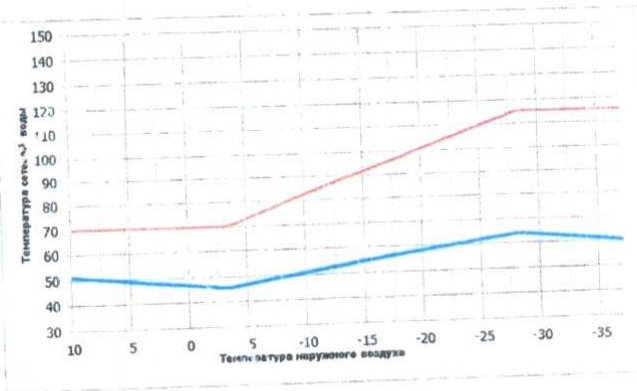

Источник	Расход (т/час)	Давление на отметке "0" (н. вод.ст.)		Производительность подпиточного устройства (т/час)	
		подводящий т/провод	обратный т/провод	нормальная	аварийная
ВК Гор.больница	70	55	25	0.3	8

Технический директор - главный инженер ООО "ПСК" _____
 Зам. главного инженера по эксплуатации ООО "ПСК" _____
 Нач. отдела режимов и наладки ООО "ПСК" _____
 Нач. производственно-технического отдела ООО "ПСК" _____
 Представитель по доверенности АО "Березниковская сетевая компания" _____

С.В. Гужев _____ С.В. Гужев
Ю.Г. Суслов _____ Ю.Г. Суслов
А.А. Куприков _____ А.А. Куприков
Н.П. Ощепков _____ Н.П. Ощепков
Д.Ю. Ярицкий _____ Д.Ю. Ярицкий
