

«СОГЛАСОВАНО»

Глава города Березники

С.П. Дьяков

« » 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
Пермского филиала ПАО "Т Плюс"


С.Н. Туров

« » 2017 г.

ГРАФИК

отпуска тепла от модульной газовой котельной на отопительный сезон 2017 - 2018 г.г.

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке			Температура сетевой воды с учетом срезки и излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке		
	$t_{нв}$ °С	$T_{1к}$ °С	$T_{2к}$ °С	$T_{1от}$ °С	$T_{2от}$ °С	$T_{2от}$ °С
10	43,9	37,7	33,3	70,0	59,1	51,3
9	45,9	39,2	34,3	70,0	58,8	50,9
8	48,0	40,6	35,3	70,0	58,6	50,4
7	50,0	42,0	36,3	70,0	58,3	49,9
6	52,0	43,4	37,3	70,0	58,0	49,5
5	54,0	44,8	38,2	70,0	57,8	49,0
4	56,0	46,1	39,1	70,0	57,5	48,6
3	57,9	47,5	40,0	70,0	57,3	48,2
2	59,9	48,8	40,9	70,0	57,0	47,7
1	61,8	50,1	41,8	70,0	56,8	47,3
0	63,7	51,4	42,7	70,0	56,5	46,9
-1	65,6	52,7	43,5	70,0	56,3	46,4
-2	67,5	54,0	44,4	70,0	56,0	46,0
-3	69,4	55,3	45,2	70,0	55,8	45,6
-4	71,3	56,5	46,0	71,3	56,5	46,0
-5	73,2	57,8	46,8	73,2	57,8	46,8
-6	75,0	59,1	47,7	75,0	59,1	47,7
-7	76,9	60,3	48,5	76,9	60,3	48,5
-8	78,7	61,5	49,3	78,7	61,5	49,3
-9	80,6	62,8	50,0	80,6	62,8	50,0
-10	82,4	64,0	50,8	82,4	64,0	50,8
-11	84,2	65,2	51,6	84,2	65,2	51,6
-12	86,0	66,4	52,4	86,0	66,4	52,4
-13	87,9	67,6	53,1	87,9	67,6	53,1
-14	89,7	68,8	53,9	89,7	68,8	53,9
-15	91,5	70,0	54,6	91,5	70,0	54,6
-16	93,3	71,2	55,4	93,3	71,2	55,4
-17	95,1	72,3	56,1	95,1	72,3	56,1
-18	96,9	73,5	56,9	96,9	73,5	56,9
-19	98,6	74,7	57,6	98,6	74,7	57,6
-20	100,4	75,9	58,3	100,4	75,9	58,3
-21	102,2	77,0	59,0	102,2	77,0	59,0
-22	104,0	78,2	59,7	104,0	78,2	59,7
-23	105,7	79,3	60,5	105,7	79,3	60,5
-24	107,5	80,5	61,2	107,5	80,5	61,2
-25	109,2	81,6	61,9	109,2	81,6	61,9
-26	111,0	82,7	62,6	111,0	82,7	62,6
-27	112,7	83,9	63,3	112,7	83,9	63,3
-28	114,5	85,0	63,9	114,5	85,0	63,9
-29	116,2	86,1	64,6	115,0	85,2	63,9
-30	117,9	87,2	65,3	115,0	84,9	63,4
-31	119,7	88,4	66,0	115,0	84,7	63,0
-32	121,4	89,5	66,7	115,0	84,4	62,5
-33	123,1	90,6	67,3	115,0	84,2	62,1
-34	124,9	91,7	68,0	115,0	83,9	61,7
-35	126,6	92,8	68,7	115,0	83,6	61,3
-36	128,3	93,9	69,3	115,0	83,4	60,8
-37	130,0	95,0	70,0	115,0	83,1	60,4

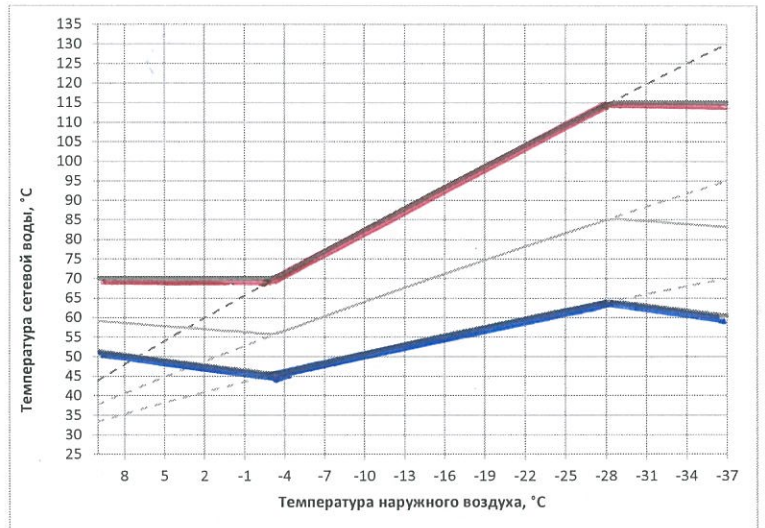

Магистраль	Расход (т/час)	Давление на отметке "0" (м. вод.ст.)		Производительность подпиточного устройства (т/час)	
		подающий т/провод	обратный т/провод	нормальная	аварийная
М-1	67,08	5,5	2,5	0,3	8

Технический директор – главный инженер
АО «Березниковская сетевая компания»

В.А. Ермаков

« » 2017 г.

Первый заместитель
главы г. Березники

В.П. Шанин

« » 2017 г.

Технический директор-главный инженер
ОСП "Березниковская" ООО "ПСК"

Л.В. Мокрушин

« » 2017 г.

Начальник управления
городского хозяйства администрации г. Березники

В.П. Зуев

« » 2017 г.

Главный специалист ПТО
ООО "ПСК"

Е.Н. Кириллова

« » 2017 г.
